RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA: NOVA 381

RODOVIA: BR-381/MG.

TRECHO: 450+400 EM BELO HORIZONTE, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-262/MG (ACESSO A SABARÁ), ATÉ O KM 146+900, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-116/MG, EM GOVERNADOR VALADARES

EXTENSÃO: 303,500 KM

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

NOVEMBRO DE 2025

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1

MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO 3
2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO 4
3. PRINCIPAIS OBRAS 7
4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 8
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS 39
6. TERMO DE ENCERRAMENTO 102

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO

- ✓ **Concessionária:** Nova 381
- ✓ **Edital de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Contrato de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Rodovia:** BR-381
- ✓ **Trecho:** Início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com BR-262/MG (p/Sabará) Até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG)
- ✓ **Extensão:** 303,500 Km
- ✓ **Assinatura do Contrato:** 23/01/2025
- ✓ **Início da Concessão:** 06/02/2025
- ✓ **Tempo de Assunção:** 30 anos

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO

A Nova 381 é responsável pela operação de 303,5 quilômetros da BR-381, que se estende do km 450+400, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG (acesso a Sabará), até o km 146+900, no entroncamento com a BR-116/MG, em Governador Valadares.

Conforme estabelecido no contrato de concessão, as obras de duplicação e melhorias no trecho inicial da rodovia (km 450+400) até o km 422+600, em Caeté, continuarão sob a responsabilidade do DNIT. Esse segmento de aproximadamente 28 quilômetros será incorporado à gestão da Nova 381 a partir do oitavo ano de concessão, quando a concessionária assumirá também a recuperação e manutenção desse trecho.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) estabelece todas as condições para a execução do contrato de concessão, definindo os serviços e obras a serem realizados pela Concessionária ao longo do período contratual. O documento também fixa as diretrizes técnicas, normas aplicáveis, parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser rigorosamente observados em todas as etapas de implantação e operação da rodovia.

O Contrato de Concessão foi assinado em janeiro de 2025, com o início da operação em 06 de agosto de 2025 e a cobrança do pedágio entre os trechos denominados P1-P2 do Km 422+600 ao Km 345+270 no dia 27 de setembro de 2025. Entre as obrigações iniciais da Concessionária, destaca-se a fase de Trabalhos Iniciais, que compreende o conjunto de obras e intervenções destinadas a restabelecer e garantir as condições mínimas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários no trecho concedido.

O trecho sob concessão está integralmente localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme representado na Figura 1.



Figura 1: Localização do trecho concedido em MG.

A Concessão conta 7 bases operacionais e 5 pedágios eletrônicos (free flow) ao longo do trecho concedido. Na figura 2 ilustra todas unidades operacionais, frota e localização.



Figura 2: Localização das unidades e frota operacionais

3. PRINCIPAIS OBRAS

Os Trabalhos Iniciais correspondem ao conjunto de serviços executados pela concessionária logo após o início da concessão, com o objetivo de garantir condições adequadas de trafegabilidade, conforto e segurança aos usuários da rodovia, conforme os parâmetros de desempenho definidos no PER.

Essas atividades abrangem o cadastro e caracterização do trecho concedido, contemplando disciplinas como pavimento, sinalização, drenagem, obras de arte correntes e especiais, terraplenos, contenções, canteiros centrais, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais e sistemas elétricos.

Nos serviços de pavimento, prevê, fresagem, recomposição e reparos localizados, buscando restabelecer os níveis mínimos de serventia ao usuário.

Na sinalização e elementos de proteção e segurança viária, realizam-se a substituição e revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea, além da recuperação de defensas metálicas, barreiras new Jersey, tela antiofuscante e tela antisuicídio.

Os sistemas de drenagem e obras de arte correntes passam por limpeza e recuperação para assegurar o escoamento adequado e a integridade do corpo estradal, bem como manter a segurança estrutural.

Os canteiros centrais e faixas de domínio recebem serviços de conservação e manutenção, priorizados conforme as condições identificadas em campo.

Por fim, nas edificações e instalações operacionais, foram implantadas 7 Bases de Serviço Operacional (BSOs), execução de terraplenagem, fundação, superestrutura, cobertura, pintura, identidade visual e implantação de medidas necessárias para o suporte das atividades operacionais.

De forma geral, os Trabalhos Iniciais têm caráter emergencial e preparatório, garantindo que a rodovia atinja padrões mínimos de desempenho e segurança até a execução das intervenções definitivas previstas no contrato de concessão.

4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

No mês de outubro, as principais obras e serviços foram executados ao longo do trecho, abrangendo a recuperação de erosões, demolições e recomposição de placas de concreto do pavimento rígido, fresagem e recomposição em CBUQ, além de reparos profundos no pavimento flexível. Também foram realizados serviços de limpeza e manutenção das drenagens — como canaletas e sarjetas, execução de cercas de mourão, entre outros serviços que serão detalhados diariamente a seguir, com suas respectivas localizações.

❖ Pavimento

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
05/10/2025 a 11/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
05/10/2025 a 11/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
05/10/2025 a 11/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
05/10/2025 a 11/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
12/10/2025 a 18/10/2025	Pavimento Rígido (Demolição e recomposição de placas)	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais/Caeté	385+000	422+000	1 | 2		X		
12/10/2025 a 18/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
12/10/2025 a 18/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
12/10/2025 a 18/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Belo Oriente/Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
12/10/2025 a 18/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Belo Oriente/Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Pavimento Rígido (Demolição e recomposição de placas)	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais/Caeté	385+000	422+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Belo Oriente/Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Belo Oriente/Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Pavimento Rígido (Demolição e recomposição de placas)	BR-381	Leste/Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	285+000	315+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Ipatinga/Coronel Fabriciano	252+300	255+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Belo Oriente/Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Pavimento Flexível (Fresagem e recomposição de CBUQ / Reparo profundo)	BR-381	Leste / Oeste	Belo Oriente/Santana do Paraíso	228+000	235+000	1 | 2		X		

❖ Erosões

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
05/10/2025 a 11/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Governador Valadares	147+000	164+667	1	X	X		X
05/10/2025 a 11/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Periquito	164+667	182+333	1	X	X		X
05/10/2025 a 11/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Naque	182+333	200+000	1	X	X		X
06/10/2025 a 10/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	223+675	223+675		X	X		X
06/10/2025 a 10/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	223+580	223+580		X	X		X
06/10/2025 a 10/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	223+600	223+600		X	X		X
06/10/2025 a 10/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	223+635	223+635		X	X		X
12/10/2025 a 18/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Governador Valadares	147+000	164+667	1	X	X		X
12/10/2025 a 18/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Periquito	164+667	182+333	1	X	X		X
12/10/2025 a 18/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Naque	182+333	200+000	1	X	X		X
13/10/2025 a 17/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Naque/Belo Oriente	200	229		X			X
12/10/2025 a 18/10/2025	Serviços de Recuperação de Áreas com Erosão	BR-381	Leste / Oeste	Antônio Dias/Antônio Dias	285+000	290+000	1 | 2		X		
12/10/2025 a 18/10/2025	Serviços de Recuperação de Áreas com Erosão	BR-381	Leste / Oeste	Antônio Dias/Antônio Dias	285+000	290+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Governador Valadares	147+000	164+667	1	X	X		X
19/10/2025 a 25/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Periquito	164+667	182+333	1	X	X		X
19/10/2025 a 25/10/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Naque	182+333	200+000	1	X	X		X
20/10/2025 a 24/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	211+000	211+000		X			X
20/10/2025 a 24/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	223+000	223+000			X		X
20/10/2025 a 24/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Santana do Paraíso	229+000	229+000		X			X
19/10/2025 a 25/10/2025	Serviços de Recuperação de Áreas com Erosão	BR-381	Leste / Oeste	Antônio Dias/Antônio Dias	285+000	290+000	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Serviços de Recuperação de Áreas com Erosão	BR-381	Leste / Oeste	Antônio Dias/Antônio Dias	285+000	290+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Governador Valadares	147+000	164+667	1	X	X		X
26/10/2025 a 01/11/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Periquito	164+667	182+333	1	X	X		X
26/10/2025 a 01/11/2025	Recuperação de erosões	BR-381	Leste / Oeste	Naque	182+333	200+000	1	X	X		X
27/10/2025 a 31/10/2025	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO	BR-381	L\O	Belo Oriente	223+000	223+675		X			X
26/10/2025 a 01/11/2025	Serviços de Recuperação de Áreas com Erosão	BR-381	Leste / Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	357+700	358+000	1 | 2		X		
26/10/2025 a 01/11/2025	Serviços de Recuperação de Áreas com Erosão	BR-381	Leste / Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	357+700	358+000	1 | 2		X		

❖ Drenagem

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
12/10/2025 a 18/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Execução de serviços de Drenagem	BR-381	Leste / Oeste	Antônio Dias	290+000	300+000		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Execução de serviços de Drenagem	BR-381	Leste / Oeste	Antônio Dias	290+000	300+000		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Execução de serviços de Drenagem		Leste / Oeste	Antônio Dias	290+000	300+000		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Execução de serviços de Drenagem		Leste / Oeste	Antônio Dias	290+000	300+000		X			
20/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
21/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		X			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
22/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
23/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
24/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
25/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Execução de serviços de Drenagem		Leste / Oeste	Antônio Dias	290+000	300+000		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Execução de serviços de Drenagem		Leste / Oeste	Antônio Dias	290+000	300+000		x			
27/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
27/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo		L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
28/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
28/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo		L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
29/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
29/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo		L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
30/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
30/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo		L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
31/10/2025	Desobstrução de Bueiro		L/O	Timóteo/Antônio Dias	260	290		x			
31/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo		L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem		L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			

❖ Sinalização

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
05/10/2025 a 11/10/2025	Instalação de Marcos Quilométricos	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Nova Era	422+000	328+000		X			
05/10/2025 a 11/10/2025	Sinalização Horizontal Provisória/Definitiva	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100	1 | 2		X		
06/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Governador Valadares	147	322	1	X			
06/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
06/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
06/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
06/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
06/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
06/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/ Bela Vista de Minas	370	330		X			
06/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
06/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Governador Valadares	147	422		X			
07/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	322	1	X			
07/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
07/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
07/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
07/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
07/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
07/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
07/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
07/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
08/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
08/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
08/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
08/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
08/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
08/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
08/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
08/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
08/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
09/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
09/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
09/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
09/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
09/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
09/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
09/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
09/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
09/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
10/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
10/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
10/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
10/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
10/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
10/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
10/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
10/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
10/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	422		X			
11/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
11/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
11/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
11/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
11/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
11/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
11/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
11/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
11/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Instalação de Marcos Quilométricos	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Nova Era	422+000	328+000	1 | 2	X			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
12/10/2025 a 18/10/2025	Sinalização Horizontal Provisória/Definitiva	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100	1 | 2		X		
19/10/2025 a 25/10/2025	Instalação de Marcos Quilométricos	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Nova Era	422+000	328+000		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Sinalização Horizontal Provisória/Definitiva	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100	1 | 2		X		
20/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
20/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
20/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
20/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
20/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
20/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
20/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
20/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
20/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
21/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
21/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
21/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
21/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
21/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
21/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
21/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
21/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
21/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
22/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X			
22/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	X	X	3	
22/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
22/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	X	X	3	
22/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	X	X	3	
22/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		X			
22/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		X			
22/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
22/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			

nova 381

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
23/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x			
23/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
23/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
23/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
23/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	x	X	3	
23/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		x			
23/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		x			
23/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
23/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
24/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x			
24/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
24/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
24/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
24/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	x	X	3	
24/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		x			
24/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		x			
24/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
24/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
25/10/2025	Implantação de Delineador	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x			
25/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
25/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
25/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
25/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/São Gonçalo do Rio Abaixo	400	370	1	x	X	3	
25/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390		x			
25/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	370	330		x			
25/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
25/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Instalação de Marcos Quilométricos	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Nova Era	422+000	328+000		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Sinalização Horizontal Provisória/Definitiva	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100	1 | 2		X		
27/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383	1	x	X	3	

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
27/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383	1	x	X	3	
27/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383	1	x	X	3	
27/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290		x			
27/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147		x			
27/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
27/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
28/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
28/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
28/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
28/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290		x			
28/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147		x			
28/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
28/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
29/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
29/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
29/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
29/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290		x			
29/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147		x			
29/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
29/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
30/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
30/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
30/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
30/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290		x			
30/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147		x			
30/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
30/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
31/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	390	1	x	X	3	
31/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
31/10/2025	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322	1	x	X	3	
31/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
31/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147		X			
31/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
31/10/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
01/11/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290		X			
01/11/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147		X			
01/11/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
01/11/2025	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			

❖ Elementos de Proteção e Segurança

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
05/10/2025 a 11/10/2025	Execução de Cercas de Arame e Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
05/10/2025 a 11/10/2025	Recomposição de Cerca de Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
05/10/2025 a 11/10/2025	Recomposição de Defensa Metálica	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/São Gonçalo do Rio Abaixo	422+000	380+000		X			
	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Belo Oriente/Governador Valadares	147	220	1	X	X	3	
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Caeté/Nova Era	322	422	1	X	X	3	
	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
12/10/2025 a 18/10/2025	Execução de Cercas de Arame e Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100	1 | 2	X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Recomposição de Cerca de Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100	1 | 2	X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Recomposição de Defensa Metálica	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/São Gonçalo do Rio Abaixo	422+000	380+000	1 | 2	X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Execução de Cercas de Arame e Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Recomposição de Cerca de Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Recomposição de Defensa Metálica	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/São Gonçalo do Rio Abaixo	422+000	380+000		X			
20/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
20/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
20/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
20/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
21/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
21/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
21/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
21/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
22/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
22/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
22/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
22/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
23/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
23/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
23/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
23/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
24/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
24/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
24/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
24/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		
25/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
25/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	220	1	X	X	3	
25/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Nova Era/Caeté	322	422	1	X	X	3	
25/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Antônio Dias	283	295	1	X	X		

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
26/10/2025 a 01/11/2025	Execução de Cercas de Arame e Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
26/10/2025 a 01/11/2025	Recomposição e Remoção de Cerca de Mourão de concreto	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
26/10/2025 a 01/11/2025	Recomposição de Defensa Metálica	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/São Gonçalo do Rio Abaixo	422+000	380+000		X			
27/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290	1	X	X	3	
27/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147	1	X	X	3	
27/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Nova Era	330	320	1	X	X		
28/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290	1	X	X	3	
28/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147	1	X	X	3	
28/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Nova Era	330	320	1	X	X		
29/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290	1	X	X	3	
29/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147	1	X	X	3	
29/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Nova Era	330	320	1	X	X		
30/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290	1	X	X	3	
30/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147	1	X	X	3	
30/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Nova Era	330	320	1	X	X		
31/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Caeté/Antônio Dias	422	290	1	X	X	3	
31/10/2025	Implantação e Manutenção de Defensa Metálica	BR-381	L/O	Antônio Dias/Governador Valadares	290	147	1	X	X	3	
31/10/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Nova Era	330	320	1	X	X		
01/11/2025	Execução de Barreira New Jersey	BR-381	L/O	Nova Era	330	320	1	X	X		

❖ Limpeza, Roçada e Poda

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
05/10/2025 a 11/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
05/10/2025 a 11/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
06/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250	1	X			
06/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Governador Valadares	147	422		X			
06/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	383	422		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era/Governador Valadares	147	322		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era/Ipatinga	250	322		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era/Governador Valadares	147	322		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		X			
06/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
06/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
06/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250	1	X			
07/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Ipatinga/Governador Valadares	147	250	1	X			
07/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Governador Valadares	147	422		X			
07/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Belo Oriente	147	322		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/São Gonçalo do Rio Abaixo	383	353		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	São Gonçalo do Rio Abaixo/Nova Era	353	322		X			
07/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
07/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
07/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
08/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
08/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
08/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/João Monlevade	383	353		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		X			
08/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
08/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
08/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
09/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
09/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
09/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		X			
09/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
09/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
09/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
10/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
10/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
10/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		X			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
10/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
10/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
10/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
11/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
11/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
11/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
11/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		X			
11/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		X			
11/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		X			
20/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	X			
20/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		X			
20/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
20/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
20/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
20/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
21/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
21/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
21/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
21/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
21/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
21/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
22/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
22/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
22/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
22/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
22/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
22/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
23/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
23/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
23/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
23/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
23/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
23/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
24/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
24/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
24/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
24/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
24/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
24/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
25/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
25/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
25/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
25/10/2025	Limpeza de Telas Antiofuscante	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	383	353		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	João Monlevade/Nova Era	353	322		x			
25/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Nova União	422	409		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova União/Bom Jesus do Amparo	409	396		x			
25/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo/Barão de Cocais	396	383		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		x			
26/10/2025 a 01/11/2025	Serviços de limpeza e manutenção de pista, canaletas e sarjetas	BR-381	Leste / Oeste	Caeté/Governador Valadares	422+650	153+100		x			
27/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
27/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
27/10/2025	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
27/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
27/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
27/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
27/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Antônio Dias	290	307		x			
27/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
28/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
28/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
28/10/2025	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
28/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
28/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
28/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
28/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Antônio Dias	290	307		x			
28/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
29/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
29/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
29/10/2025	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
29/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
29/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
29/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
29/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Antônio Dias	290	307		x			
29/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
30/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
30/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
30/10/2025	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
30/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
30/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
30/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
30/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Antônio Dias	290	307		x			
30/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
31/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
31/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			
31/10/2025	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
31/10/2025	Limpeza e Revitalização de Dispositivo	BR-381	L/O	Caeté/Bom Jesus do Amparo	422	386	1				
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Antônio Dias	147	290		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias/Bela Vista de Minas	290	337		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Bela Vista de Minas/Barão de Cocais	337	383		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais/Caeté	383	422		x			
31/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
31/10/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Caeté/Barão de Cocais	422	383		x			
31/10/2025	Roçada	BR-381	L/O	Antônio Dias	290	307		x			
31/10/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
01/11/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
01/11/2025	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250	1	x			
01/11/2025	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares/Caeté	147	422		x			

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Ipatinga	147	250		X			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares/Nova Era	147	322		X			
01/11/2025	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Ipatinga/Nova Era	250	322		X			

❖ **OAE**


PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Faixa	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
					Inicial km+m	Final km+m					
05/10/2025 a 11/10/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
05/10/2025 a 11/10/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
12/10/2025 a 18/10/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
19/10/2025 a 25/10/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
26/10/2025 a 01/11/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			
26/10/2025 a 01/11/2025	Restauração e Reforço dos Consoles Pórtico - Ponte Sobre Rio do Peixe	BR-381	Leste / Oeste	Nova Era	325+850	325+950		X			

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela Nova 381 em outubro de 2025.

❖ Pavimento

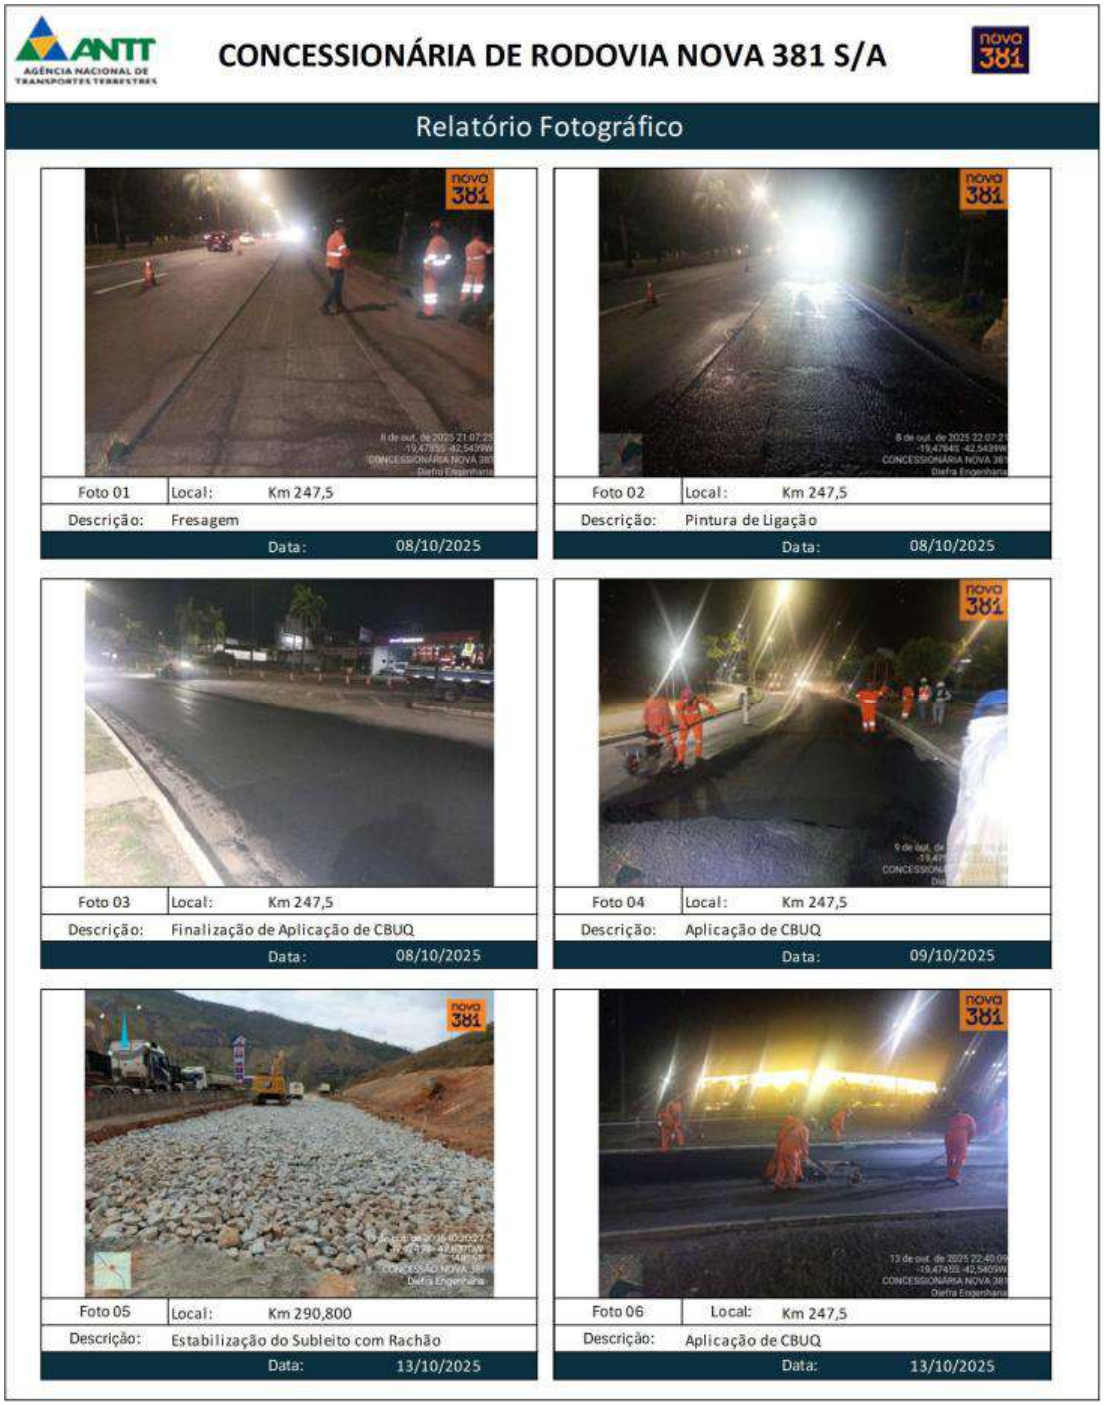

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico

Foto 01	Local:	Km 247,5
Descrição:	Fresagem	
	Data:	08/10/2025

Foto 02	Local:	Km 247,5
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	08/10/2025

Foto 03	Local:	Km 247,5
Descrição:	Finalização de Aplicação de CBUQ	
	Data:	08/10/2025

Foto 04	Local:	Km 247,5
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	09/10/2025

Foto 05	Local:	Km 290,800
Descrição:	Estabilização do Subleito com Rachão	
	Data:	13/10/2025

Foto 06	Local:	Km 247,5
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	13/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 290,800
Descrição:	Lançamento de BGS	
	Data:	14/10/2025



Foto 08	Local:	Km 290,800
Descrição:	Compactação da Camada de BGS	
	Data:	14/10/2025



Foto 09	Local:	Km 247,5
Descrição:	Fresagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 10	Local:	Km 247,5
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	14/10/2025



Foto 11	Local:	Km 247,5
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	14/10/2025



Foto 12	Local:	Km 247,5 Ramo 6
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	15/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	Km 247,5 Ramo 6
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	15/10/2025



Foto 14	Local:	Km 247,5 Ramo 6
Descrição:	CBUQ Aplicado	
	Data:	15/10/2025



Foto 15	Local:	Km 290,800
Descrição:	Camada de Concreto Compactado a Rolo CCR	
	Data:	16/10/2025



Foto 16	Local:	Km 290,800
Descrição:	Camada de Concreto Compactado a Rolo CCR	
	Data:	16/10/2025



Foto 17	Local:	Km 247,5 Ramo 2
Descrição:	Fresagem	
	Data:	17/10/2025



Foto 18	Local:	Km 247,5 Ramo 2
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	17/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Pintura de Ligação		
	Data:	18/10/2025	



Foto 20	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Aplicação de CBUQ		
	Data:	18/10/2025	



Foto 21	Local:	Km 290	
Descrição:	Demolição de Pavimento Rígido		
	Data:	20/10/2025	



Foto 22	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Fresagem		
	Data:	20/10/2025	



Foto 23	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Aplicação de CBUQ		
	Data:	20/10/2025	



Foto 24	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Fresagem		
	Data:	21/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Pintura de Ligação		
	Data:	21/10/2025	



Foto 26	Local:	Km 247	Ramo 2
Descrição:	Aplicação de CBUQ		
	Data:	21/10/2025	



Foto 27	Local:	Km 290
Descrição:	Demolição de Pavimento Rígido	
	Data:	21/10/2025



Foto 28	Local:	Km 290
Descrição:	Demolição de Pavimento Rígido	
	Data:	21/10/2025



Foto 29	Local:	Km 290
Descrição:	Limpeza do Pavimento Demolido	
	Data:	22/10/2025



Foto 30	Local:	Km 290
Descrição:	Preparação da Placa de Concreto	
	Data:	22/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	Km 290
Descrição:	Execução da Malha Para Concretagem	
	Data:	23/10/2025



Foto 32	Local:	Km 290
Descrição:	Preparação Para Concretagem da Placa	
	Data:	23/10/2025



Foto 33	Local:	Km 296
Descrição:	Aplicação da Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2025



Foto 34	Local:	Km 296
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	23/10/2025



Foto 35	Local:	Km 296
Descrição:	Espalhamento e Conformação com Acabadora	
	Data:	23/10/2025



Foto 36	Local:	Km 296
Descrição:	Compactação com Rolo	
	Data:	23/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	Km 290
Descrição:	Demolição da Placa de Concreto	
	Data:	23/10/2025



Foto 38	Local:	Km 296
Descrição:	Aplicação de Pintura de Ligação	
	Data:	24/10/2025



Foto 39	Local:	Km 290
Descrição:	Limpeza do Pavimento Demolido	
	Data:	24/10/2025



Foto 40	Local:	Km 290
Descrição:	Preparação da Placa Para Concretagem	
	Data:	24/10/2025



Foto 41	Local:	Km 295,5 Ponte Severo
Descrição:	Fresagem	
	Data:	24/10/2025



Foto 42	Local:	Km 295,5 Ponte Severo
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	24/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 43	Local:	Km 288
Descrição:	Reparo Localizado	
	Data:	24/10/2025



Foto 44	Local:	Km 288
Descrição:	Reparo Localizado	
	Data:	24/10/2025



Foto 45	Local:	Km 288
Descrição:	Reparo Localizado	
	Data:	24/10/2025



Foto 46	Local:	Km 290
Descrição:	Concretagem de Placa	
	Data:	27/10/2025



Foto 47	Local:	Km 290
Descrição:	Concretagem de Placa	
	Data:	27/10/2025



Foto 48	Local:	Km 290
Descrição:	Cura Úmida	
	Data:	27/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 49	Local:	Km 247	Ramo 3
Descrição:	Fresagem		
	Data:	27/10/2025	



Foto 50	Local:	Km 247	Ramo 3
Descrição:	Pintura de Ligação		
	Data:	27/10/2025	



Foto 51	Local:	Km 247	Ramo 3
Descrição:	Aplicação de CBUQ		
	Data:	27/10/2025	



Foto 52	Local:	Km 247	Ramo 7
Descrição:	Fresagem		
	Data:	27/10/2025	



Foto 53	Local:	Km 247	Ramo 7
Descrição:	Pintura de Ligação		
	Data:	27/10/2025	



Foto 54	Local:	Km 247	Ramo 7
Descrição:	Espalhamento e Conformação com Acabadora		
	Data:	28/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 55	Local:	Km 247	Ramo 7
Descrição:	Fresagem		
Data:	29/10/2025		



Foto 56	Local:	Km 247	Ramo 7
Descrição:	Pintura de Ligação		
Data:	29/10/2025		



Foto 57	Local:	Km 247	Ramo 7
Descrição:	Aplicação de CBUQ		
Data:	29/10/2025		



Foto 58	Local:	Km 290	
Descrição:	Cura Úmida		
Data:	29/10/2025		



Foto 59	Local:	Km 290	
Descrição:	Preparação de Placa Para Concretagem		
Data:	29/10/2025		



Foto 60	Local:	Km 290	
Descrição:	Concretagem de Placa		
Data:	29/10/2025		

❖ Erosões

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 180
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	13/10/2025



Foto 02	Local:	Km 180
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	13/10/2025



Foto 03	Local:	Km 223
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	15/10/2025



Foto 04	Local:	Km 223
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	15/10/2025



Foto 05	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	21/10/2025



Foto 06	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	21/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	22/10/2025



Foto 08	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	22/10/2025



Foto 09	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	24/10/2025



Foto 10	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	24/10/2025



Foto 11	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	27/10/2025



Foto 12	Local:	Km 285,260
Descrição:	Recuperação de Erosão	
	Data:	27/10/2025

❖ **Drenagem**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 192,3
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	07/10/2025



Foto 02	Local:	Km 192,3
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	07/10/2025



Foto 03	Local:	Km 193
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 04	Local:	Km 193
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 05	Local:	Km 175,3
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 06	Local:	Km 175,3
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 175,3
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 08	Local:	Km 175,3
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 09	Local:	Km 233,7
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 10	Local:	Km 233,7
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 11	Local:	Km 235,6
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 12	Local:	Km 235,6
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 14	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 15	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 16	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 17	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 18	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 20	Local:	Km 176,5
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 21	Local:	Km 233,9
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	14/10/2025



Foto 22	Local:	Km 233,9
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025



Foto 23	Local:	Km 233,9
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	13/10/2025



Foto 24	Local:	Km 233,9
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	Km 176,32
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025



Foto 26	Local:	Km 175,30
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025



Foto 27	Local:	Km 176,32
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025



Foto 28	Local:	Km 176,32
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025



Foto 29	Local:	Km 176,32
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025



Foto 30	Local:	Km 176,32
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	15/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	Km 235,4
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	16/10/2025



Foto 32	Local:	Km 235,4
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	16/10/2025



Foto 33	Local:	Km 235,4
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	16/10/2025



Foto 34	Local:	Km 235,4
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	16/10/2025



Foto 35	Local:	Km 148,2
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	21/10/2025



Foto 36	Local:	Km 148,2
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	21/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	Km 148,2
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	21/10/2025



Foto 38	Local:	Km 148,2
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	21/10/2025



Foto 39	Local:	Km 147,2
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	22/10/2025



Foto 40	Local:	Km 147,2
Descrição:	Reparo do dispositivo de drenagem	
	Data:	22/10/2025

❖ Sinalização Vertical

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 297
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 02	Local:	Km 297
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 03	Local:	Km 296
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 04	Local:	Km 296
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 05	Local:	Km 302,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 06	Local:	Km 302,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 243,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 08	Local:	Km 243,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 09	Local:	Km 249,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 10	Local:	Km 249,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 11	Local:	Km 248,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 12	Local:	Km 248,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	Km 243,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 14	Local:	Km 243,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 15	Local:	Km 268,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 16	Local:	Km 268,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	01/10/2025



Foto 17	Local:	Km 221,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 18	Local:	Km 221,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	Km 228,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 20	Local:	Km 228,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 21	Local:	Km 256,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 22	Local:	Km 256,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 23	Local:	Km 256,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 24	Local:	Km 256,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	Km 268,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 26	Local:	Km 268,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 27	Local:	Km 278,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 28	Local:	Km 278,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 29	Local:	Km 247,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 30	Local:	Km 247,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	Km 247
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 32	Local:	Km 247
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 33	Local:	Km 302,4
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 34	Local:	Km 302,4
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 35	Local:	Km 317,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025



Foto 36	Local:	Km 317,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	02/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	Km 183,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 38	Local:	Km 183,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 39	Local:	Km 152,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 40	Local:	Km 152,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 41	Local:	Km 194,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 42	Local:	Km 194,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 43	Local:	Km 147
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 44	Local:	Km 147
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 45	Local:	Km 176,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 46	Local:	Km 176,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 47	Local:	Km 287,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 48	Local:	Km 287,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 49	Local:	Km 247,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 50	Local:	Km 247,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 51	Local:	Km 226,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 52	Local:	Km 226,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	03/10/2025



Foto 53	Local:	Km 237
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 54	Local:	Km 237
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 55	Local:	Km 237
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 56	Local:	Km 237
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 57	Local:	Km 220,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 58	Local:	Km 220,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 59	Local:	Km 191,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 60	Local:	Km 191,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 61	Local:	Km 165,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 62	Local:	Km 165,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 63	Local:	Km 182,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 64	Local:	Km 182,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 65	Local:	Km 194,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 66	Local:	Km 194,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico

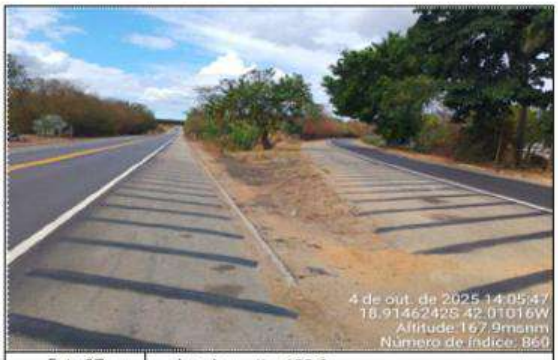


Foto 67	Local:	Km 155,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 68	Local:	Km 155,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 69	Local:	Km 155,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 70	Local:	Km 155,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 71	Local:	Km 182
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025



Foto 72	Local:	Km 182
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	04/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 73	Local:	Km 194,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 74	Local:	Km 194,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 75	Local:	Km 194,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 76	Local:	Km 194,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 77	Local:	Km 298,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 78	Local:	Km 298,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 79	Local:	Km 259,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 80	Local:	Km 259,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 81	Local:	Km 268,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 82	Local:	Km 268,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 83	Local:	Km 268
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 84	Local:	Km 268
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 85	Local:	Km 410,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 86	Local:	Km 410,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	06/10/2025



Foto 87	Local:	Km 208,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 88	Local:	Km 208,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 89	Local:	Km 208,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 90	Local:	Km 208,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 91	Local:	Km 208,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 92	Local:	Km 196,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 93	Local:	Km 216,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 94	Local:	Km 196,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	07/10/2025



Foto 95	Local:	Km 195,6
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 95	Local:	Km 194,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 96	Local:	Km 188,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 97	Local:	Km 153,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 98	Local:	Km 164,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 99	Local:	Km 189,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 100	Local:	Km 246
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 100	Local:	Km 250
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 101	Local:	Km 253
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 102	Local:	Km 244,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 103	Local:	Km 255,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 104	Local:	Km 255,6
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 105	Local:	Km 255,6
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 105	Local:	Km 255,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 106	Local:	Km 254,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 107	Local:	Km 255,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 108	Local:	Km 255,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 109	Local:	Km 243,1
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	08/10/2025



Foto 110	Local:	Km 248,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025



Foto 110	Local:	Km 242,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 111	Local:	Km 221,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025



Foto 112	Local:	Km 220,0
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025

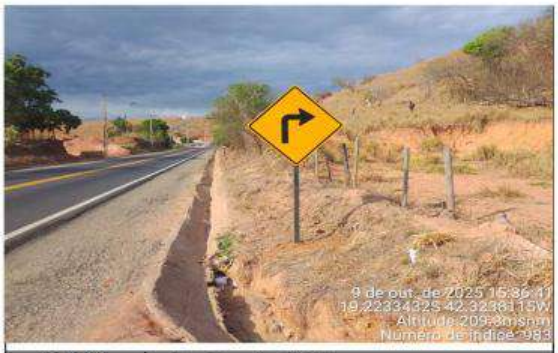


Foto 113	Local:	Km 207,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025



Foto 114	Local:	Km 152,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025



Foto 115	Local:	Km 152,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	09/10/2025



Foto 115	Local:	Km 304
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	10/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 116	Local:	Km 281,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	10/10/2025



Foto 117	Local:	Km 219,0
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 118	Local:	Km 213,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 119	Local:	Km 206,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 120	Local:	Km 153,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 120	Local:	Km 153,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 121	Local:	Km 152,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 122	Local:	Km 149,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 123	Local:	Km 155,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 124	Local:	Km 155,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 125	Local:	Km 159,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025



Foto 125	Local:	Km 174,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	11/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 126	Local:	Km 182,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	11/10/2025	



Foto 127	Local:	Km 195
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	11/10/2025	



Foto 128	Local:	Km 195
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	11/10/2025	



Foto 129	Local:	Km 226,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	11/10/2025	



Foto 130	Local:	Km 343
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	12/10/2025	



Foto 130	Local:	Km 343
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	12/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 131	Local:	Km 253,1
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	12/10/2025



Foto 132	Local:	Km 260,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	12/10/2025



Foto 133	Local:	Km 260,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	12/10/2025



Foto 134	Local:	Km 262,8
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	12/10/2025



Foto 135	Local:	Km 279,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	12/10/2025



Foto 135	Local:	Km 280,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	12/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 136	Local:	Km 277,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	13/10/2025



Foto 137	Local:	Km 283
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	13/10/2025



Foto 138	Local:	Km 282,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	13/10/2025



Foto 139	Local:	Km 282,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	13/10/2025



Foto 140	Local:	Km 280
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025



Foto 140	Local:	Km 263,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 141	Local:	264
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025



Foto 142	Local:	Km 299
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025



Foto 143	Local:	Km 299
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025



Foto 144	Local:	Km 299
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025



Foto 145	Local:	Km 299
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	14/10/2025



Foto 145	Local:	Km 240
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 146	Local:	Km 220,6
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025



Foto 147	Local:	Km 296,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025



Foto 148	Local:	Km 302
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025



Foto 149	Local:	Km 322,3
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025



Foto 150	Local:	Km 317,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025



Foto 150	Local:	Km 325,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 151	Local:	Km 343,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	15/10/2025



Foto 152	Local:	Km 153
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	16/10/2025



Foto 153	Local:	Km 221
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	16/10/2025



Foto 154	Local:	Km 190
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	17/10/2025



Foto 155	Local:	Km 183
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	17/10/2025



Foto 155	Local:	Km 245,7
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
	Data:	20/10/2025

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 156	Local:	Km 224,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	20/10/2025	



Foto 157	Local:	Km 207,9
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	20/10/2025	



Foto 158	Local:	Km 291,2
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	21/10/2025	



Foto 159	Local:	Km 283,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	22/10/2025	



Foto 160	Local:	Km 208,5
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	23/10/2025	



Foto 160	Local:	Km 257,4
Descrição:	Implementação de sinalização vertical	
Data:	23/10/2025	

❖ Sinalização Horizontal

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	**Km 156**	Leste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	10/10/2025	



Foto 08	Local:	**Km 284**	Leste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	10/10/2025	



Foto 09	Local:	**Km 176**	Leste/Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	14/10/2025	



Foto 10	Local:	**Km 325**	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	20/10/2025	



Foto 11	Local:	**Km 325**	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	20/10/2025	



Foto 12	Local:	**Km 324**	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	20/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 209	Leste/Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	02/10/2025	



Foto 02	Local:	Km 194	Leste/Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	06/10/2025	



Foto 03	Local:	Km 195	Leste/Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	06/10/2025	



Foto 04	Local:	Km 194	Leste/Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	06/10/2025	



Foto 05	Local:	Km 155	Leste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	07/10/2025	



Foto 06	Local:	Km 155	Leste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	07/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	Km 297	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	22/10/2025	



Foto 14	Local:	Km 322	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	22/10/2025	



Foto 15	Local:	Km 321	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		



Foto 16	Local:	Km 321	Oeste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		



Foto 17	Local:	Km 300	Leste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	04/10/2025	



Foto 18	Local:	Km 295	Leste
Descrição:	Revitalização da Sinalização Horizontal		
	Data:	04/10/2025	

❖ Elementos de Proteção e Segurança

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	**Km 394**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	01/10/2025	



Foto 02	Local:	**Km 394**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	01/10/2025	



Foto 03	Local:	**Km 394**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	01/10/2025	



Foto 04	Local:	**Km 394**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	01/10/2025	



Foto 05	Local:	**Km 385**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	02/10/2025	



Foto 06	Local:	**Km 385**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	02/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	Km 385	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	03/10/2025	



Foto 08	Local:	Km 385	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	03/10/2025	



Foto 09	Local:	Km 242	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 10	Local:	Km 242	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	06/10/2025	



Foto 11	Local:	Km 229	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 12	Local:	Km 229	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	06/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	**Km 303**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	07/10/2025	



Foto 14	Local:	**Km 303**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	07/10/2025	



Foto 15	Local:	**Km 303**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	07/10/2025	



Foto 16	Local:	**Km 303**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	07/10/2025	



Foto 17	Local:	**Km 290**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	09/10/2025	



Foto 18	Local:	**Km 290**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	09/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	**Km 359**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	10/10/2025	



Foto 20	Local:	**Km 359**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	10/10/2025	



Foto 21	Local:	**Km 257**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 22	Local:	**Km 257**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 23	Local:	**Km 257**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 24	Local:	**Km 257**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	11/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 25	Local:	**Km 257**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 26	Local:	**Km 257**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	11/10/2025	



Foto 27	Local:	**Km 255**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	13/10/2025	



Foto 28	Local:	**Km 255**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	13/10/2025	



Foto 29	Local:	**Km 230**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	13/10/2025	



Foto 30	Local:	**Km 230**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	13/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 31	Local:	**Km 230**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	13/10/2025	



Foto 32	Local:	**Km 230**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	13/10/2025	



Foto 33	Local:	**Km 257**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	04/10/2025	



Foto 34	Local:	**Km 257**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	14/10/2025	



Foto 35	Local:	**Km 392**	
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	14/10/2025	



Foto 36	Local:	**Km 392**	
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	14/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 37	Local:	**Km 279**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	15/10/2025	



Foto 38	Local:	**Km 279**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	16/10/2025	



Foto 39	Local:	**Km 279**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	16/10/2025	



Foto 40	Local:	**Km 279**	Oeste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	16/10/2025	



Foto 41	Local:	**Km 374**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	16/10/2025	



Foto 42	Local:	**Km 374**	Leste
Descrição:	Implantação de Defensa Metalica		
	Data:	16/10/2025	

❖ **Limpeza, Roçada e Poda**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	**Km 220**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 02	Local:	**Km 220**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 03	Local:	**Km 220**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 04	Local:	**Km 220**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 05	Local:	**Km 221**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 06	Local:	**Km 221**	Oeste
Descrição:			
	Data:	01/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 07	Local:	**Km 223**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 08	Local:	**Km 223**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 09	Local:	**Km 223**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 10	Local:	**Km 223**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 11	Local:	**Km 221**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 12	Local:	**Km 221**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 13	Local:	**Km 221**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 14	Local:	**Km 221**	Oeste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	01/10/2025	



Foto 15	Local:	**Km 391**	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	13/10/2025	



Foto 16	Local:	**Km 391**	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	13/10/2025	



Foto 17	Local:	**Km 352**	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	10/10/2025	



Foto 18	Local:	**Km 352**	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	10/10/2025	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 19	Local:	km 178	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	13/10/2025	



Foto 20	Local:	km 178	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	13/10/2025	



Foto 21	Local:	Km 292	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	15/10/2025	



Foto 22	Local:	Km 292	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	15/10/2025	



Foto 23	Local:	Km 297	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	16/10/2025	



Foto 24	Local:	Km 297	Leste
Descrição:	Roçada de Revestimento Vegetal		
	Data:	16/10/2025	

❖ **OAE**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico



Foto 01	Local:	Km 325,950
Descrição:	Montagem da Armação	
	Data:	06/10/2025



Foto 02	Local:	Km 325,950
Descrição:	Execução da Fôrma Para Concretagem	
	Data:	09/10/2025



Foto 03	Local:	Km 325,950
Descrição:	Console Concretado	
	Data:	14/10/2025



Foto 04	Local:	Km 325,950
Descrição:	Montagem da armação	
	Data:	17/10/2025



Foto 05	Local:	Km 325,950
Descrição:	Montagem da armação	
	Data:	27/10/2025



Foto 06	Local:	Km 325,950
Descrição:	Montagem de Fôrma para Concretagem	
	Data:	28/10/2025

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 102 (cento e duas) folhas devidamente identificadas e numeradas.
