RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA: NOVA 381

RODOVIA: BR-381/MG.

TRECHO: 450+400 EM BELO HORIZONTE, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-262/MG (ACESSO A SABARÁ), ATÉ O KM 146+900, NO ENTRONCAMENTO COM A BR-116/MG, EM GOVERNADOR VALADARES

EXTENSÃO: 303,500 KM

REFERÊNCIA: OUTUBRO/2026

OUTUBRO DE 2026

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1

MENSAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO 3
2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO 4
3. PRINCIPAIS OBRAS 7
4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS 8
5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS 17
6. TERMO DE ENCERRAMENTO 97

1. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DA CONCESSÃO

- ✓ **Concessionária:** Nova 381
- ✓ **Edital de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Contrato de Concessão:** 01/2024
- ✓ **Rodovia:** BR-381
- ✓ **Trecho:** Início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com BR-262/MG (p/Sabará) Até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG)
- ✓ **Extensão:** 303,500 Km
- ✓ **Assinatura do Contrato:** 23/01/2025
- ✓ **Início da Concessão:** 06/02/2025
- ✓ **Tempo de Assunção:** 30 anos

2. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO

A Nova 381 é responsável pela operação de 303,5 quilômetros da BR-381, que se estende do km 450+400, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG (acesso a Sabará), até o km 146+900, no entroncamento com a BR-116/MG, em Governador Valadares.

Conforme estabelecido no contrato de concessão, as obras de duplicação e melhorias no trecho inicial da rodovia (km 450+400) até o km 421+900, em Caeté, continuarão sob a responsabilidade do DNIT. Esse segmento de aproximadamente 28,5 quilômetros será incorporado à gestão da Nova 381 a partir do oitavo ano de concessão, quando a concessionária assumirá também a recuperação e manutenção desse trecho.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) estabelece todas as condições para a execução do contrato de concessão, definindo os serviços e obras a serem realizados pela Concessionária ao longo do período contratual. O documento também fixa as diretrizes técnicas, normas aplicáveis, parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser rigorosamente observados em todas as etapas de implantação e operação da rodovia.

O Contrato de Concessão foi assinado em janeiro de 2025, com o início da operação em 06 de agosto de 2025 e a cobrança do pedágio entre os trechos denominados P1-P2 do Km 421+900 ao Km 345+270 no dia 27 de setembro de 2025. Entre as obrigações iniciais da Concessionária, destaca-se a fase de Trabalhos Iniciais, que compreende o conjunto de obras e intervenções destinadas a restabelecer e garantir as condições mínimas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários no trecho concedido.

O trecho sob concessão está integralmente localizado no Estado de Minas Gerais (MG), conforme representado na Figura 1.



Figura 1: Localização do trecho concedido em MG.

A Concessão conta 7 bases operacionais e 5 pedágios eletrônicos (free flow) ao longo do trecho concedido. Na figura 2 ilustra todas unidades operacionais, frota e localização.



Figura 2: Localização das unidades e frota operacionais

3. PRINCIPAIS OBRAS

Os Trabalhos Iniciais correspondem ao conjunto de serviços executados pela concessionária logo após o início da concessão, com o objetivo de garantir condições adequadas de trafegabilidade, conforto e segurança aos usuários da rodovia, conforme os parâmetros de desempenho definidos no PER.

Essas atividades abrangem o cadastro e caracterização do trecho concedido, contemplando disciplinas como pavimento, sinalização, drenagem, obras de arte correntes e especiais, terraplenos, contenções, canteiros centrais, faixa de domínio, edificações, instalações operacionais e sistemas elétricos.

Nos serviços de pavimento, prevê, fresagem, recomposição e reparos localizados, buscando restabelecer os níveis mínimos de serventia ao usuário.

Na sinalização e elementos de proteção e segurança viária, realizam-se a substituição e revitalização da sinalização horizontal, vertical e aérea, além da recuperação de defensas metálicas, barreiras new Jersey, tela antiofuscante e tela antisuicídio.

Os sistemas de drenagem e obras de arte correntes passam por limpeza e recuperação para assegurar o escoamento adequado e a integridade do corpo estradal, bem como manter a segurança estrutural.

Os canteiros centrais e faixas de domínio recebem serviços de conservação e manutenção, priorizados conforme as condições identificadas em campo.

Por fim, nas edificações e instalações operacionais, foram implantadas 7 Bases de Serviço Operacional (BSOs), execução de terraplenagem, fundação, superestrutura, cobertura, pintura, identidade visual e implantação de medidas necessárias para o suporte das atividades operacionais.

De forma geral, os Trabalhos Iniciais têm caráter emergencial e preparatório, garantindo que a rodovia atinja padrões mínimos de desempenho e segurança até a execução das intervenções definitivas previstas no contrato de concessão.

4. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

No mês de Outubro/2026, as principais obras e serviços executados na BR-381/MG contemplaram recuperação e manutenção de pavimento, controle de erosão, obras de drenagem, sinalização viária, roçada e capina, limpeza de pista e faixa de domínio, poda e supressão vegetal, contenção e estabilização de taludes, obras de arte especiais (OAE), ponto de parada e descanso (PPD), serviços de terceiros na faixa de domínio e implantação do posto de pesagem veicular (HS WIM).

❖ Pavimento

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	357+000	367+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	367+000	377+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Fresagem e Recomposição de CBUQ)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	377+000	387+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	144+000	154+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	154+000	164+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	174+000	184+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Periquito	184+000	194+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Periquito	194+000	204+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Naque	204+000	214+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Belo Oriente	214+000	224+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Belo Oriente	224+000	234+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Flexivel (Recomposição de acostamento)	BR-381	Leste/Oeste	Santana do Paraíso	234+000	244+000		X				X					
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	380+000	390+000			X								
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	390+000	400+000			X								
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	400+000	410+000			X								
04/10/2026 a 25/10/2026	Pavimento Rígido (Demolição e Recomposição de Placas)	BR-381	Leste/Oeste	Nova União	410+000	420+000			X								
04/10/2026 a 18/10/2026	Pavimento Rígido (Pintura de sinalização horizontal)	BR-381	Leste/Oeste	São Gonçalo do Rio Abaixo	380+000	390+000		X	X	X							
04/10/2026 a 18/10/2026	Pavimento Rígido (Pintura de sinalização horizontal)	BR-381	Leste/Oeste	Antônio Dias	290+000	291+000		X	X	X							
04/10/2026 a 18/10/2026	Pavimento Rígido (Pintura de sinalização horizontal)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	390+000	400+000		X	X	X							
04/10/2026 a 18/10/2026	Pavimento Rígido (Pintura de sinalização horizontal)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	400+000	410+000		X	X	X							
04/10/2026 a 18/10/2026	Pavimento Rígido (Pintura de sinalização horizontal)	BR-381	Leste/Oeste	Nova União	410+000	420+000		X	X	X							
25/10/2026	Pavimento Flexivel (Execução do Black Top)	BR-381	Leste/Oeste	Antônio Dias	283+000	285+000		X				X					
05/10/2026 a 31/10/2026	Operação Tapa Buraco	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X							X		
05/10/2026 a 31/10/2026	Operação Tapa Buraco	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X							X		

❖ Erosões

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura(Tratamento de erosão)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	284+000	291+000					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura(Tratamento de erosão)	BR-381	Oeste	Jaguaraçu	281+000	282+000					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura(Tratamento de erosão)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	305+300	305+350					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura(Tratamento de erosão)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	283+850	283+850					X			

❖ Drenagem

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Horário		Localização / Interdição (X)										
					Inicio	Fim	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
04/10/2026 a 25/10/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Antônio Dias	308+000	318+000					X						
04/10/2026 a 25/10/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	318+000	328+000					X						
04/10/2026 a 25/10/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	328+000	338+000					X						
04/10/2026 a 25/10/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	Bela Vista de Minas	338+000	348+000					X						
04/10/2026 a 25/10/2026	Drenagem (Reconstrução dos dispositivos)	BR-381	Leste/Oeste	João Monlevade	348+000	358+000					X						
04/10/2026 a 25/10/2026	Drenagem (Construção de bueiro ARMCO)	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	160+970	160+970					X						
	Terraplanagem / Drenagem (Segmento 1)	BR-381	Oeste	Jaguaraçu	280+000	280+000					X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Desobstrução de Bueiro/Hidrojato	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	250+000					X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Antônio Dias	290+000	337+000					X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza de Drenagem	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000	X	X			X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	383+000			X		X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza e Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Barão de Cocais	383+000	422+000	X				X						
05/10/2026 a 31/10/2026	Recomposição de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000			X		X						
05/10/2026 a 30/10/2026	Limpeza de Drenagem	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000	X	X			X						

❖ Sinalização

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
04/10/2026 a 31/10/2026	Lavagem de Placas	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X			X
04/10/2026 a 10/10/2026	Remoção de Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X	X		X	X	3	
04/10/2026 a 31/10/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X	X		X	X	3	
05/10/2026 a 31/10/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Lavagem de Placas	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X			X
04/10/2026 a 10/10/2026	Remoção de Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X	X		X	X	3	
04/10/2026 a 31/10/2026	Sinalização Horizontal	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X	X		X	X	3	
05/10/2026 a 31/10/2026	Sinalização Vertical	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			

❖ Roçada

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
04/10/2026 a 31/10/2026	Roçada	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000					X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Refilamento	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Roçada	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000					X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Refilamento	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X			

❖ Limpeza

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
04/10/2026 a 31/10/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X				X		
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Antônio Dias	295+000	283+000		X									
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza de pé de barreira	BR-381	L/O	Belo Oriente	220+000	224+000		X									
04/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Bom Jesus do Amparo	386+000	422+000		X									
04/10/2026 a 31/10/2026	Recolha de Lixo e Entulho	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X				X		
05/10/2026 a 31/10/2026	Limpeza de pé de barreira e desobstrução de caixa	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	326+000		X									

❖ Poda

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
04/10/2026 a 31/10/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Governador Valadares	147+000	322+000		X			X	X	3	
04/10/2026 a 31/10/2026	Corte e poda de árvores e arbustos	BR-381	L/O	Nova Era	322+000	422+000		X			X	X	3	

❖ Talude

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
04/10/2026 a 18/10/2026	Terraplanagem/ Drenagem/ Contenção/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	287+000	289+000			X		X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	299+180	299+180		X						
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	304+000	306+000		X						
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Jaguaraçu	280+400	280+400					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	288+950	288+950			X					
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	289+450	289+450					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Jaguaraçu	280+650	291+000					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	295+650	295+650					X			
	Terraplanagem /drenagem (Base da PRF)	BR-381	Oeste	Jaguaraçu	276+000	278+000					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura(Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	296+450	296+450					X			
	Serviço de Contenção de Taludes / Drenagem	BR-381	Oeste	Antônio Dias	304+700	304+700		X			X			
	Disposição de material em bota-fora	BR-381	Leste	Antônio Dias	301+000	301+000					X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura/Contenção (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	288+950	288+950			X					
25/10/2026	Drenagem / Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	287+850	287+850			X		X			
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Oeste	Antônio Dias	303+700	303+700		X						
	Terraplanagem/ Drenagem/ Hidrossemeadura (Talude)	BR-381	Leste	Antônio Dias	290+650	290+650					X			
	Terraplanagem /drenagem /pavimentação (Base da PRF)	BR-381	Oeste	Jaguaraçu	276+000	278+000					X			

❖ OAE

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro										
					Inicial km+m	Final km+m	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
	Ponte do rio do peixe (contra fortes)	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	320+400	320+500					X				
04/10/2026 a 10/10/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Ipatinga	245+850	245+850		X	X		X		1 km		
11/10/2026 a 17/10/2026	RECUPERAÇÃO DE OAE	BR-381	Leste/Oeste	Nova Era	319+500	321+500						X	2 km		

❖ PPD

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
04/10/2026 a 25/10/2026	Edificação (PPD)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	387+650	387+650					X			
04/10/2026 a 11/10/2026	Terraplanagem /Drenagem/Edificação (PPD)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	387+650	387+650			X		X			
	Terraplanagem (Área de empréstimo PPD)	BR-381	Leste	São Gonçalo do Rio Abaixo	378+000	379+000					X			
18/10/2026 a 25/10/2026	Terraplanagem /Drenagem (PPD)	BR-381	Leste	Bom Jesus do Amparo	387+650	387+650			X		X			

❖ Faixa de Domínio

OBRAS E SERVIÇOS

Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)										
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.	Pàss. Infer.	Pàss. Super.	Pàssar.
04/10/2026 a 31/10/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia, Manutenções Emergenciais (podendo se estender para horário noturno, inclusive em finais de semana ou feriados) e/ou Programadas visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Governador Valadares	162+000	250+500								X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia, Manutenções Emergenciais (podendo se estender para horário noturno, inclusive em finais de semana ou feriados) e/ou Programadas visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	273+800	341+500								X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Vistoria preventiva em obras na Faixa de Domínio da rodovia, Manutenções Emergenciais (podendo se estender para horário noturno, inclusive em finais de semana ou feriados) e/ou Programadas visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Barão de Cocais	383+300	450+300								X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Vistoria preventiva nas obras de duplicação da rodovia e remanejamento de postes/rede interferentes com o novo traçado da rodovia, visando garantir a Continuidade Operacional da Rede Óptica denominada Tronco Belo Horizonte - Governador Valadares. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	422+000	450+300								X			
07/10/2026 a 14/10/2026	Remoção de cabos desativados em travessia da rodovia próximo ao Clube Free Time. OBS.: Haverá necessidade fechamento de ambas as pistas para a remoção dos cabos desativados. Atividade de remoção dos cabos de curta duração.	BR-381	Leste/Oeste	Caeté	415+850	415+850	X	X	X	X	X			X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro. OBS.: A maioria dos postes estão fora do limite da Faixa de Domínio. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Jaguaraçu	269+000	342+000								X			
04/10/2026 a 31/10/2026	Substituição de postes danificados da rede da Claro. OBS.: A maioria dos postes estão fora do limite da Faixa de Domínio. Havendo necessidade de interdição de Acostamento ou Faixa/Pista o CCO da Nova381 será comunicado antecipadamente.	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	400+000	450+300								X			
25/10/2026 a 31/10/2026	Substituição de doois postes danificados por queimada. Um dos postes é de travessia da rodovia e apresenta risco de queda na pista. OBS.: Demandará apoio da concessionária porque a faixa 2 da Pista Leste deverá ser fechada.	BR-381	Leste/Oeste	Sabará	429+000	429+200			X					X			

❖ Posto de Pesagem (HS WIM)

OBRAS E SERVIÇOS														
Data	Tipo de Serviço	Rodovia	Sentido Leste/Oeste	Município	Quilômetro		Localização / Interdição (X)							
					Inicial km+m	Final km+m	Cant. Cent.	Faixa 01	Faixa 02	Faixa 03	Acost.	Pare e siga	Extensão (km)	Faixa Dom.
	Posto de pesagem veicular -HS WIM (Execução de terraplanagem /pavimentação)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	390+000	391+000		X						
	Posto de pesagem veicular -HS WIM (Execução de pavimentação/drenagem)	BR-381	Leste/Oeste	Bom Jesus do Amparo	390+000	391+000		X						

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS

Apresentamos fotos das principais obras e serviços realizados pela Nova 381 em outubro de 2026.

❖ Pavimento

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 01	Local:	Km 389
Descrição:	Armação de Pavimento	
	Data:	21/10/2026



Foto 02	Local:	Km 389
Descrição:	Armação de Pavimento	
	Data:	21/10/2026



Foto 03	Local:	Km 389
Descrição:	Armação de Pavimento	
	Data:	21/10/2026



Foto 04	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	22/10/2026



Foto 05	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	22/10/2026



Foto 06	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	22/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 07	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	22/10/2026



Foto 08	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	22/10/2026



Foto 09	Local:	Km 389
Descrição:	Armação de Pavimento	
	Data:	22/10/2026



Foto 10	Local:	Km 169
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 11	Local:	Km 169
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 12	Local:	Km 374
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 13	Local:	Km 374
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2026



Foto 14	Local:	Km 375
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 15	Local:	Km 375
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 16	Local:	Km 375
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 17	Local:	Km 375
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 18	Local:	Km 374
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 19	Local:	Km 374
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 20	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 21	Local:	Km 374
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 22	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 23	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 24	Local:	Km 374
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 25	Local:	Km 374
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 26	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 27	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 28	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 29	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 30	Local:	Km 374
Descrição:	Limpeza de Fresagem	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 31	Local:	Km 374
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2026



Foto 32	Local:	Km 374
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2026



Foto 33	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 34	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 35	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 36	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 37	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 38	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 39	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 40	Local:	Km 374
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 41	Local:	Km 374
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 42	Local:	Km 374
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 43	Local:	Km 375
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 44	Local:	Km 375
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 45	Local:	Km 375
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	23/10/2026

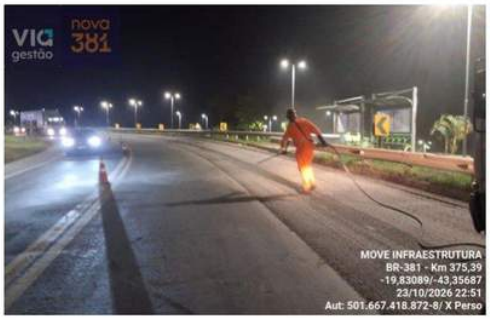


Foto 46	Local:	Km 375
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 47	Local:	Km 375
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	23/10/2026



Foto 48	Local:	Km 375
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 49	Local:	Km 375
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2026



Foto 50	Local:	Km 375
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2026

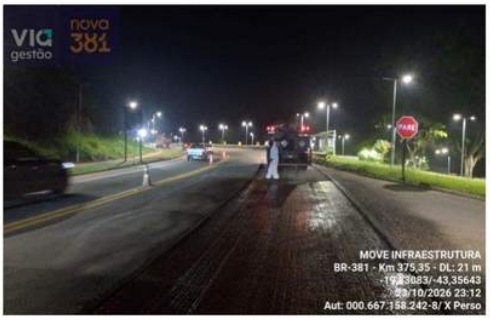


Foto 51	Local:	Km 375
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	23/10/2026



Foto 52	Local:	Km 375
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	23/10/2026



Foto 53	Local:	Km 376
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	24/10/2026



Foto 54	Local:	Km 375
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	24/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 55	Local:	Km 375
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	24/10/2026



Foto 56	Local:	Km 375
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	24/10/2026



Foto 57	Local:	Km 375
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	24/10/2026



Foto 58	Local:	Km 375
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	24/10/2026



Foto 59	Local:	Km 375
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	24/10/2026



Foto 60	Local:	Km 376
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	24/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 61	Local:	Km 376
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	24/10/2026



Foto 62	Local:	Km 376
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	24/10/2026



Foto 63	Local:	Km 376
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	24/10/2026



Foto 64	Local:	Km 376
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	24/10/2026



Foto 65	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	26/10/2026



Foto 66	Local:	Km 169
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 67	Local:	Km 169
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	26/10/2026



Foto 68	Local:	Km 167
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	26/10/2026



Foto 69	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	27/10/2026



Foto 70	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	27/10/2026



Foto 71	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	27/10/2026



Foto 72	Local:	Km 382
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	27/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 73	Local:	Km 382
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	27/10/2026



Foto 74	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 75	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 76	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 77	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 78	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 79	Local:	Km 382
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 80	Local:	Km 382
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 81	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 82	Local:	Km 382
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 83	Local:	Km 382
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 84	Local:	Km 382
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 85	Local:	Km 382
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 86	Local:	Km 166
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	28/10/2026



Foto 87	Local:	Km 166
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 88	Local:	Km 166
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 89	Local:	Km 166
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	28/10/2026



Foto 90	Local:	Km 169
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 91	Local:	Km 166
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 92	Local:	Km 166
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 93	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 94	Local:	Km 382
Descrição:	Fresagem de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 95	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 96	Local:	Km 382
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 97	Local:	Km 382
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	28/10/2026



Foto 98	Local:	Km 382
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	28/10/2026



Foto 99	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 100	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	28/10/2026



Foto 101	Local:	Km 382
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 102	Local:	Km 382
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 103	Local:	Km 382
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 104	Local:	Km 382
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 105	Local:	Km 382
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 106	Local:	Km 382
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 107	Local:	Km 382
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	28/10/2026



Foto 108	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 109	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 110	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 111	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 112	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 113	Local:	Km 382
Descrição:	Controle Tecnológico de Pavimento	
	Data:	28/10/2026



Foto 114	Local:	Km 159
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 115	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 116	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 117	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	29/10/2026



Foto 118	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	29/10/2026



Foto 119	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	29/10/2026



Foto 120	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 121	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	29/10/2026



Foto 122	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Base e Sub-base	
	Data:	29/10/2026



Foto 123	Local:	Km 387
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 124	Local:	Km 167
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 125	Local:	Km 167
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 126	Local:	Km 167
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 127	Local:	Km 167
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 128	Local:	Km 167
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 129	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 130	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 131	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 132	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 133	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 134	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 135	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 136	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 137	Local:	Km 387
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 138	Local:	Km 165
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 139	Local:	Km 165
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 140	Local:	Km 387
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 141	Local:	Km 387
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 142	Local:	Km 387
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 143	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 144	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 145	Local:	Km 166
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 146	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 147	Local:	Km 165
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 148	Local:	Km 166
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 149	Local:	Km 165
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 150	Local:	Km 165
Descrição:	Aplicação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 151	Local:	Km 165
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 152	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 153	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 154	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 155	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 156	Local:	Km 387
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 157	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 158	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 159	Local:	Km 159
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 160	Local:	Km 159
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 161	Local:	Km 159
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 162	Local:	Km 159
Descrição:	Limpeza de Pavimento	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 163	Local:	Km 159
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 164	Local:	Km 159
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	29/10/2026



Foto 165	Local:	Km 159
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	29/10/2026



Foto 166	Local:	Km 159
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	29/10/2026



Foto 167	Local:	Km 159
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	29/10/2026



Foto 168	Local:	Km 159
Descrição:	Pintura de Ligação	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Pavimento



Foto 169	Local:	Km 159
Descrição:	Compactação de Pavimento	
	Data:	29/10/2026



Foto 170	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 171	Local:	Km 387
Descrição:	Compactação de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 172	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 173	Local:	Km 389
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026



Foto 174	Local:	Km 388
Descrição:	Execução de CBUQ	
	Data:	29/10/2026

❖ **Drenagem**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 01	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 02	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 03	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 04	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 05	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 06	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 07	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 08	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Dreno Profundo	
	Data:	23/10/2026



Foto 09	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 10	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 11	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 12	Local:	Km 161
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 13	Local:	Km 160
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 14	Local:	Km 160
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 15	Local:	Km 160
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 16	Local:	Km 160
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 17	Local:	Km 161
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 18	Local:	Km 161
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 19	Local:	Km 161
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 20	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 21	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 22	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 23	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 24	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 25	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 26	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 27	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 28	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 29	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 30	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Dreno Profundo	
	Data:	27/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 31	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 32	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 33	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 34	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 35	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 36	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Dreno Profundo	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 37	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 38	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 39	Local:	Km 283
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 40	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 41	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 42	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 43	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 44	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 45	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 46	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 47	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 48	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Drenagem



Foto 49	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 50	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 51	Local:	Km 283
Descrição:	Controle Tecnológico de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 52	Local:	Km 283
Descrição:	Controle Tecnológico de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 53	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 54	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Drenagem	
	Data:	29/10/2026

❖ Terraplenagem e Contenção

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 01	Local:	Km 277
Descrição:	Enrocamento de Pedras	
	Data:	23/10/2026



Foto 02	Local:	Km 277
Descrição:	Enrocamento de Pedras	
	Data:	23/10/2026



Foto 03	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	23/10/2026



Foto 04	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	23/10/2026



Foto 05	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 06	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 07	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 08	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 09	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 10	Local:	Km 288
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
	Data:	23/10/2026

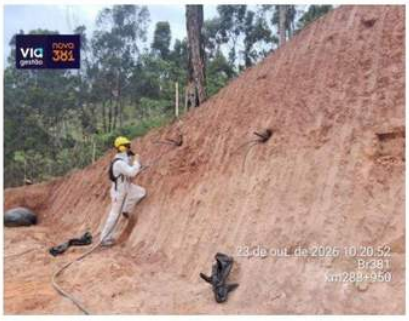


Foto 11	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	23/10/2026



Foto 12	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 13	Local:	Km 310
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	23/10/2026



Foto 14	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 15	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 16	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 17	Local:	Km 277
Descrição:	Enrocamento de Pedras	
	Data:	23/10/2026



Foto 18	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 19	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	23/10/2026



Foto 20	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 21	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 22	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 23	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 24	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 25	Local:	Km 289
Descrição:	Demolição de Concreto	
	Data:	23/10/2026



Foto 26	Local:	Km 289
Descrição:	Remoção de Demolição	
	Data:	23/10/2026



Foto 27	Local:	Km 289
Descrição:	Remoção de Demolição	
	Data:	23/10/2026



Foto 28	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	23/10/2026

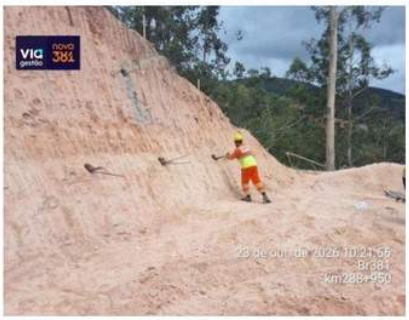


Foto 29	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	23/10/2026



Foto 30	Local:	Km 289
Descrição:	Remoção de Demolição	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 31	Local:	Km 288
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
	Data:	23/10/2026



Foto 32	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	23/10/2026



Foto 33	Local:	Km 310
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	24/10/2026



Foto 34	Local:	Km 289
Descrição:	Concretagem	
	Data:	24/10/2026



Foto 35	Local:	Km 289
Descrição:	Concretagem	
	Data:	24/10/2026



Foto 36	Local:	Km 289
Descrição:	Demolição de Concreto	
	Data:	24/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 37	Local:	Km 289
Descrição:	Demolição de Concreto	
	Data:	24/10/2026



Foto 38	Local:	Km 289
Descrição:	Demolição de Concreto	
	Data:	24/10/2026



Foto 39	Local:	Km 289
Descrição:	Concretagem	
	Data:	24/10/2026



Foto 40	Local:	Km 310
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	24/10/2026



Foto 41	Local:	Km 310
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	24/10/2026



Foto 42	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	24/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 43	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	24/10/2026	



Foto 44	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	26/10/2026	



Foto 45	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	26/10/2026	



Foto 46	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	26/10/2026	



Foto 47	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	26/10/2026	



Foto 48	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	26/10/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 49	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	26/10/2026



Foto 50	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 51	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 52	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 53	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	26/10/2026



Foto 54	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 55	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	26/10/2026



Foto 56	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	26/10/2026



Foto 57	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 58	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 59	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 60	Local:	Km 289
Descrição:	Demolição de Concreto	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 61	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	26/10/2026



Foto 62	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	26/10/2026



Foto 63	Local:	Km 289
Descrição:	Remoção de Demolição	
	Data:	26/10/2026



Foto 64	Local:	Km 277
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 65	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 66	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 67	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 68	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	26/10/2026



Foto 69	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	27/10/2026



Foto 70	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	27/10/2026



Foto 71	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	27/10/2026



Foto 72	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	27/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 73	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	27/10/2026



Foto 74	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	27/10/2026



Foto 75	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	27/10/2026



Foto 76	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	27/10/2026



Foto 77	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
	Data:	27/10/2026



Foto 78	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 79	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	27/10/2026	



Foto 80	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	27/10/2026	



Foto 81	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	27/10/2026	



Foto 82	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	27/10/2026	



Foto 83	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	27/10/2026	



Foto 84	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	27/10/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 85	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 86	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 87	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 88	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 89	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 90	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 91	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	27/10/2026



Foto 92	Local:	Km 289
Descrição:	Demolição de Concreto	
	Data:	27/10/2026



Foto 93	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 94	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 95	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 96	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 97	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 98	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 99	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 100	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 101	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 102	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 103	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	28/10/2026	



Foto 104	Local:	Km 288
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 105	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 106	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 107	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 108	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
Data:	28/10/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 109	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	28/10/2026	



Foto 110	Local:	Km 305
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 111	Local:	Km 305
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 112	Local:	Km 305
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 113	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	28/10/2026	



Foto 114	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	28/10/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 115	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	28/10/2026



Foto 116	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	28/10/2026



Foto 117	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	28/10/2026



Foto 118	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	28/10/2026



Foto 119	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 120	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 121	Local:	Km 288
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
Data:	28/10/2026	



Foto 122	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
Data:	28/10/2026	



Foto 123	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
Data:	28/10/2026	



Foto 124	Local:	Km 299
Descrição:	Execução de Hidrossemeadura	
Data:	28/10/2026	



Foto 125	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	28/10/2026	



Foto 126	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
Data:	28/10/2026	

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

nova 381

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 127	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	28/10/2026



Foto 128	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	28/10/2026



Foto 129	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	28/10/2026



Foto 130	Local:	Km 280
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 131	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	29/10/2026



Foto 132	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Terraplenagem e Contenção



Foto 133	Local:	Km 306
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 134	Local:	Km 290
Descrição:	Execução de Terraplenagem	
	Data:	29/10/2026



Foto 135	Local:	Km 288
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	29/10/2026



Foto 136	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	29/10/2026



Foto 137	Local:	Km 305
Descrição:	Execução de Contenção	
	Data:	29/10/2026



Foto 138	Local:	Km 288
Descrição:	Controle Tecnológico de Contenção	
	Data:	29/10/2026

❖ **Sinalização**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização



Foto 01	Local:	Km 376
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 02	Local:	Km 376
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 03	Local:	Km 376
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 04	Local:	Km 376
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 05	Local:	Km 376
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 06	Local:	Km 376
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização



Foto 07	Local:	Km 374
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 08	Local:	Km 374
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 09	Local:	Km 374
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 10	Local:	Km 374
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	23/10/2026



Foto 11	Local:	Km 382
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	26/10/2026



Foto 12	Local:	Km 382
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	26/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização



Foto 13	Local:	Km 382
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	26/10/2026



Foto 14	Local:	Km 382
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	27/10/2026



Foto 15	Local:	Km 382
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	27/10/2026



Foto 16	Local:	Km 167
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	28/10/2026



Foto 17	Local:	Km 382
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	28/10/2026



Foto 18	Local:	Km 382
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	28/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização



Foto 19	Local:	Km 382
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	28/10/2026



Foto 20	Local:	Km 382
Descrição:	Pintura de Vias	
	Data:	28/10/2026



Foto 21	Local:	Km 164
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 22	Local:	Km 163
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 23	Local:	Km 163
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 24	Local:	Km 163
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização



Foto 25	Local:	Km 164
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 26	Local:	Km 164
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 27	Local:	Km 164
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 28	Local:	Km 164
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 29	Local:	Km 164
Descrição:	Sinalização de Obras	
	Data:	29/10/2026



Foto 30	Local:	Km 165
Descrição:	Sinalização de Pavimento	
	Data:	29/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização Vertical



Foto 01	Local:	Km 255+052
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	22/09/2026



Foto 02	Local:	Km 248+582
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	30/09/2026



Foto 03	Local:	Km 252+609
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	05/10/2026



Foto 04	Local:	Km 287+239
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	05/10/2026



Foto 05	Local:	Km 284+376
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	05/10/2026



Foto 06	Local:	Km 282+238
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	05/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização Vertical



Foto 07	Local:	Km 246+399
Descrição:	Sinalização Vertical	
Data:	05/10/2026	



Foto 08	Local:	Km 242+981
Descrição:	Sinalização Vertical	
Data:	06/10/2026	



Foto 09	Local:	Km 242+894
Descrição:	Sinalização Vertical	
Data:	08/10/2026	



Foto 10	Local:	Km 244+929
Descrição:	Sinalização Vertical	
Data:	09/10/2026	



Foto 11	Local:	Km 246+785
Descrição:	Sinalização Vertical	
Data:	12/10/2026	



Foto 12	Local:	Km 251+478
Descrição:	Sinalização Vertical	
Data:	12/10/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização Vertical



Foto 13	Local:	Km 253+000
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	12/10/2026



Foto 14	Local:	Km 286+378
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	13/10/2026



Foto 15	Local:	Km 282+592
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	14/10/2026



Foto 16	Local:	Km 249+319
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	20/10/2026



Foto 17	Local:	Km 289+772
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	22/10/2026



Foto 18	Local:	Km 291+096
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	22/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Sinalização Vertical



Foto 19	Local:	Km 291+063
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	22/10/2026



Foto 20	Local:	Km 311+045
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	23/10/2026



Foto 21	Local:	Km 247+394
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	26/10/2026



Foto 22	Local:	Km 256+751
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	30/10/2026



Foto 23	Local:	Km 272+253
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	30/10/2026



Foto 24	Local:	Km 275+000
Descrição:	Sinalização Vertical	
	Data:	30/10/2026

❖ **Roçada**

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 01	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026



Foto 02	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026



Foto 03	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026



Foto 04	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026



Foto 05	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026



Foto 06	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 07	Local:	Km 245+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	02/10/2026



Foto 08	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	05/10/2026



Foto 09	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	05/10/2026



Foto 10	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	05/10/2026



Foto 11	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	05/10/2026



Foto 12	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	05/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 13	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
Data:	05/10/2026	



Foto 14	Local:	Km 196+600
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
Data:	05/10/2026	



Foto 15	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
Data:	06/10/2026	



Foto 16	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
Data:	06/10/2026	



Foto 17	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
Data:	06/10/2026	



Foto 18	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
Data:	06/10/2026	

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 19	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	06/10/2026



Foto 20	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	06/10/2026



Foto 21	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	06/10/2026



Foto 22	Local:	Km 191+800
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	06/10/2026



Foto 23	Local:	Km 197+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	08/10/2026



Foto 24	Local:	Km 197+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	08/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 25	Local:	Km 197+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	08/10/2026



Foto 26	Local:	Km 197+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	08/10/2026



Foto 27	Local:	Km 197+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	08/10/2026



Foto 28	Local:	Km 197+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	08/10/2026



Foto 29	Local:	Km 149+500
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	12/10/2026



Foto 30	Local:	Km 152+000
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	12/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 31	Local:	Km 152+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	12/10/2026



Foto 32	Local:	Km 152+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	12/10/2026



Foto 33	Local:	Km 197+570
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	15/10/2026



Foto 34	Local:	Km 197+570
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	15/10/2026



Foto 35	Local:	Km 238+500
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	15/10/2026



Foto 36	Local:	Km 238+500
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	15/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 37	Local:	Km 238+500
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	15/10/2026



Foto 38	Local:	Km 238+500
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	15/10/2026



Foto 39	Local:	Km 238+500
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	15/10/2026



Foto 40	Local:	Km 238+500
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	15/10/2026



Foto 41	Local:	Km 197+570
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	15/10/2026



Foto 42	Local:	Km 212+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	19/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 43	Local:	Km 212+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	19/10/2026



Foto 44	Local:	Km 212+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	19/10/2026



Foto 45	Local:	Km 212+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	19/10/2026



Foto 46	Local:	Km 212+000
Descrição:	Roçada - Sentido Oeste	
	Data:	19/10/2026



Foto 47	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026



Foto 48	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 49	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026



Foto 50	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026



Foto 51	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026



Foto 52	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026



Foto 53	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026



Foto 54	Local:	Km 166+000
Descrição:	Roçada - Ambos os sentidos	
	Data:	21/10/2026

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S/A

Relatório Fotográfico - Roçada



Foto 55	Local:	Km 200+000
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	27/10/2026



Foto 56	Local:	Km 200+000
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	27/10/2026



Foto 57	Local:	Km 200+000
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	27/10/2026



Foto 58	Local:	Km 200+000
Descrição:	Roçada - Sentido Leste	
	Data:	27/10/2026

6. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 97 (noventa e sete) folhas devidamente identificadas e numeradas.
